

Materiál na rokovanie orgánu:

Komisia dopravy a informačných systémov

ktoré sa koná dňa: 16.06.2026

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor

Predkladateľ:

Ing. Samo Rajt

Riaditeľ projektovej kancelárie magistrátu

Projektová kancelária - magistrát

Zodpovedný:

Ing. Samo Rajt

Riaditeľ projektovej kancelárie magistrátu

Projektová kancelária - magistrát

Spracovateľ:

Ing. Marek Bagi

Projektový vedúci

Projektová kancelária - magistrát

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia

2. Dôvodová správa

3. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v
Petržalke, 2.časť Bosákova ulica–Janíkov dvor

NÁVRH UZNESENIA

Komisia dopravy a informačných systémov

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prijať uznesenie v znení:

berie na vedomie

Informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor.

#Moderný magistrát


#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo |
18. jún 2026



Situácia stavby

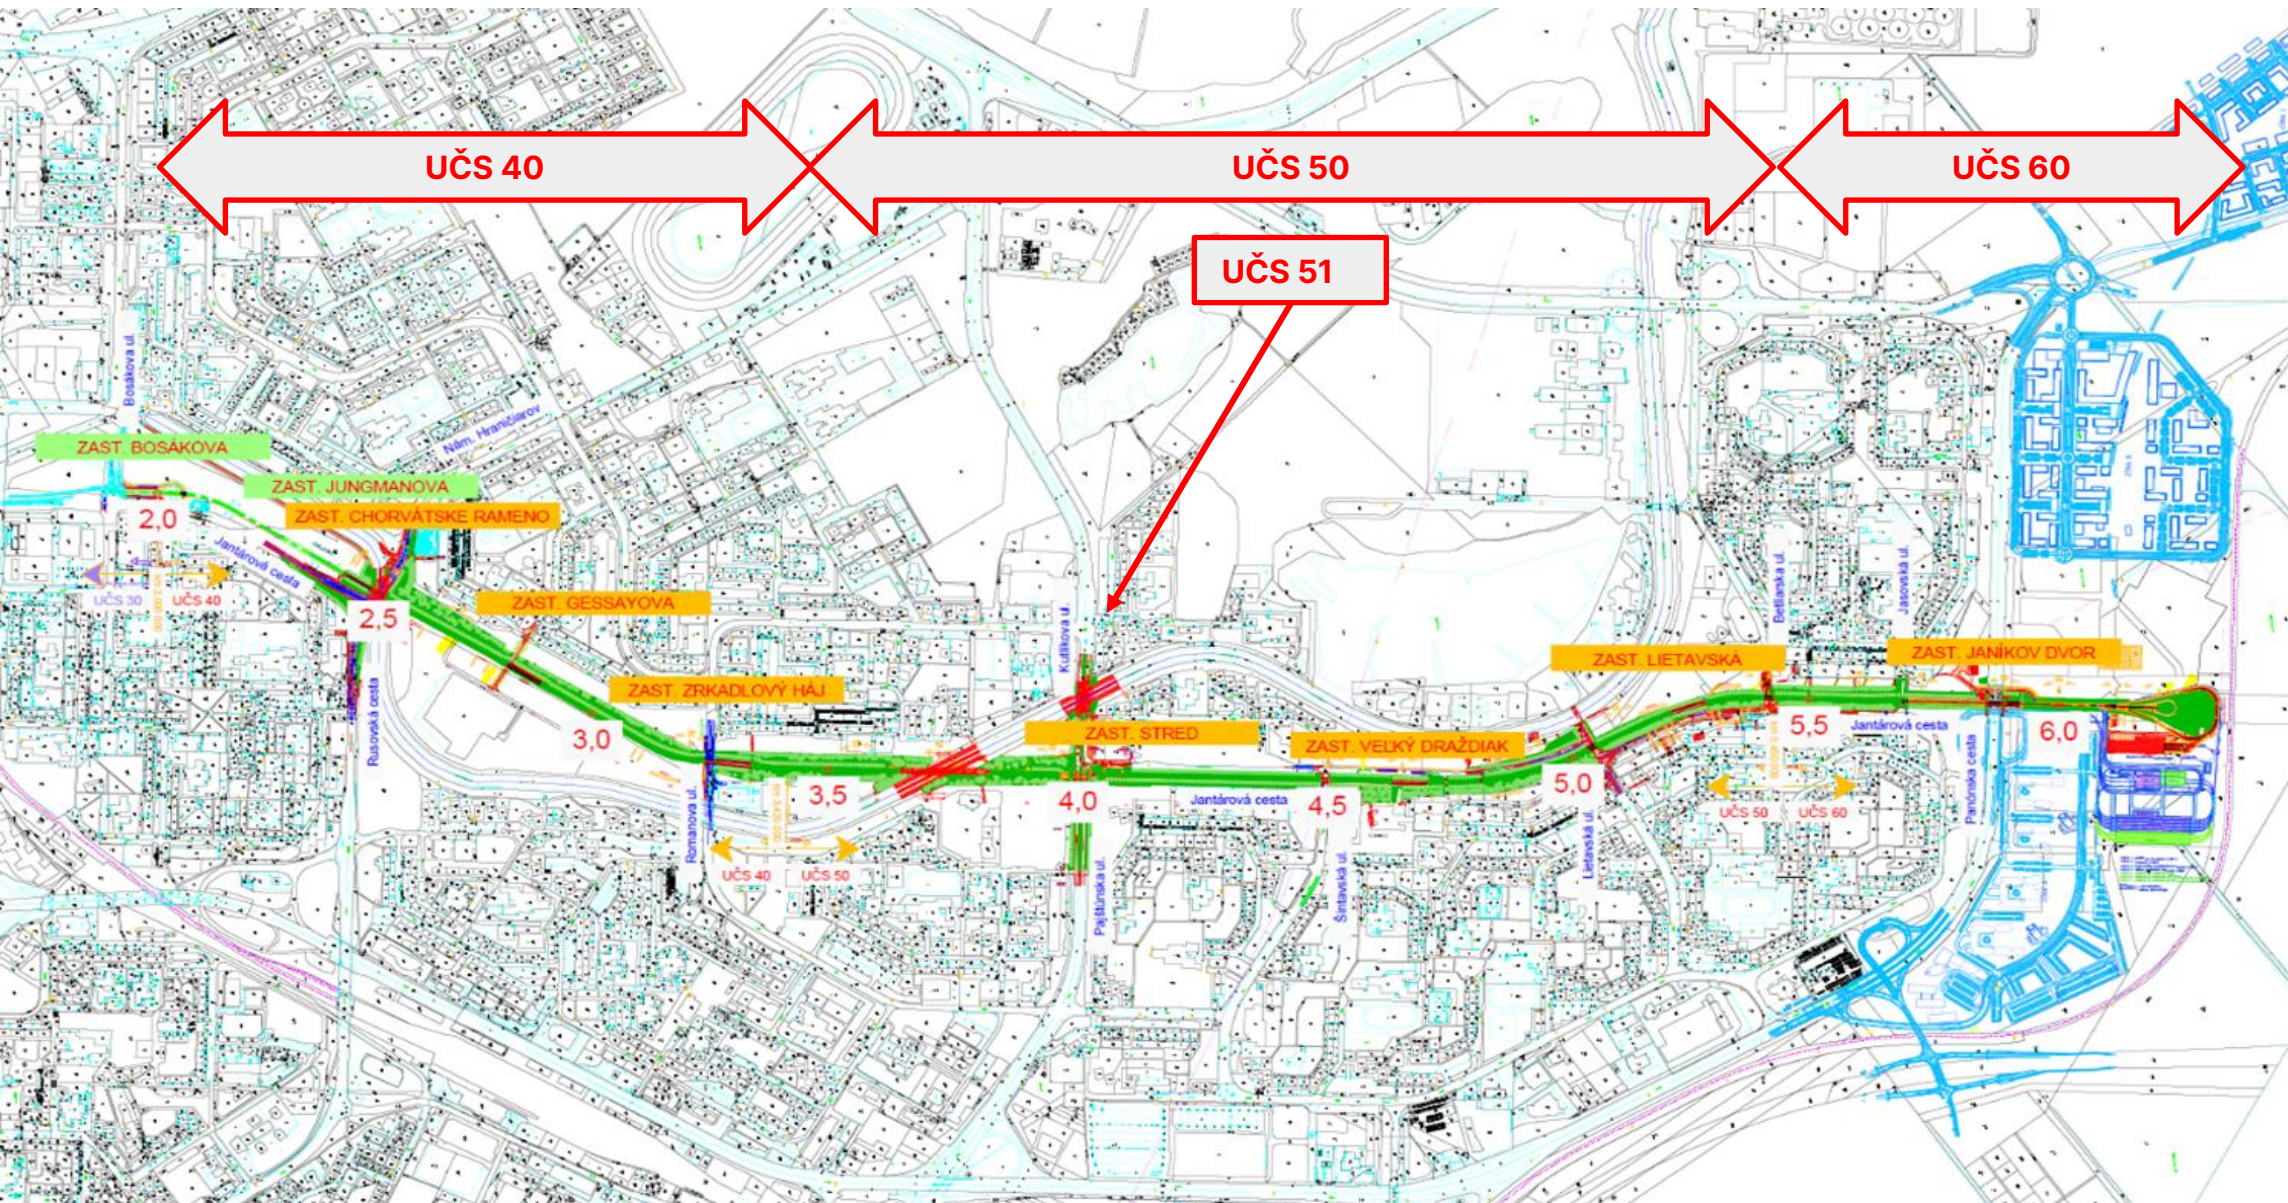

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)

Stavebne ukončené - priebieha odstraňovanie vád (všetky UČS)

UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)

Stavebne ukončené

UČS 51 Premostenie Kutlíkova

Stavebne ukončené

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)

Stavebne ukončené – prebiehajú skúšky zariadení



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia dokončených a prebiehajúcich prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia dokončených a prebiehajúcich prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Stavebne ukončené objekty – protokolárne prevzaté

Hlavné mesto podpísalo preberací protokol o dielo a v zmysle zmluvy o dielo prebieha lehota na oznámenie väd a nedorobkov v lehote 365 dní

Aktuálne prebehajú kolaudačné konania na objekty na UČS 51 a UČS 60 na stavebnom úrade MČ Petržalka a ŠSÚ BSK.

Fakturácia

Ku koncu 04/2026 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 94 602 397,04 Eur



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Dodatky k zmluve o dielo

- Uzatvorené dodatky za predošlé obdobie:
 - Dodatok č. 1 - Dodatok č. 34 k ZoD,
- Uzatvorené dodatky za aktuálne obdobie:
 - Dodatok č. 35 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 36 k ZoD v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 4Q/2025
 - Dodatok č. 37 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 38 k ZoD v ktorom sa menili kľúčový odborníci



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch


Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 - 2025)		
Časové obdobie	Valorizačný koeficient (%)	Hodnota (€)
1Q/2022	3,37%	23.803 €
2Q/2022	6,66%	47.277 €
3Q/2022	18,83%	151.309 €
4Q/2022	22,37%	599.399 €
1Q/2023	21,44%	511.546 €
2Q/2023	21,79%	639.198 €
3Q/2023	11,48%	392.163 €
4Q/2023	17,41%	751.876 €
1Q/2024*	18,19%	558.179,74 €
2Q/2024	16,79%	995.069,73 €
3Q/2024	19,38%	1 437.898,12 €
4Q/2024	22,24%	2 462.260,28 €
1Q/2025	31,72 %	2 751 982,37 €
2Q/2025	27,38%	2 263 691,97 €
3Q/2025	27,93%	1 133 523,59 €
4Q/2025	23,46%	691 088,66 €



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Externé financovanie

- Pribeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:

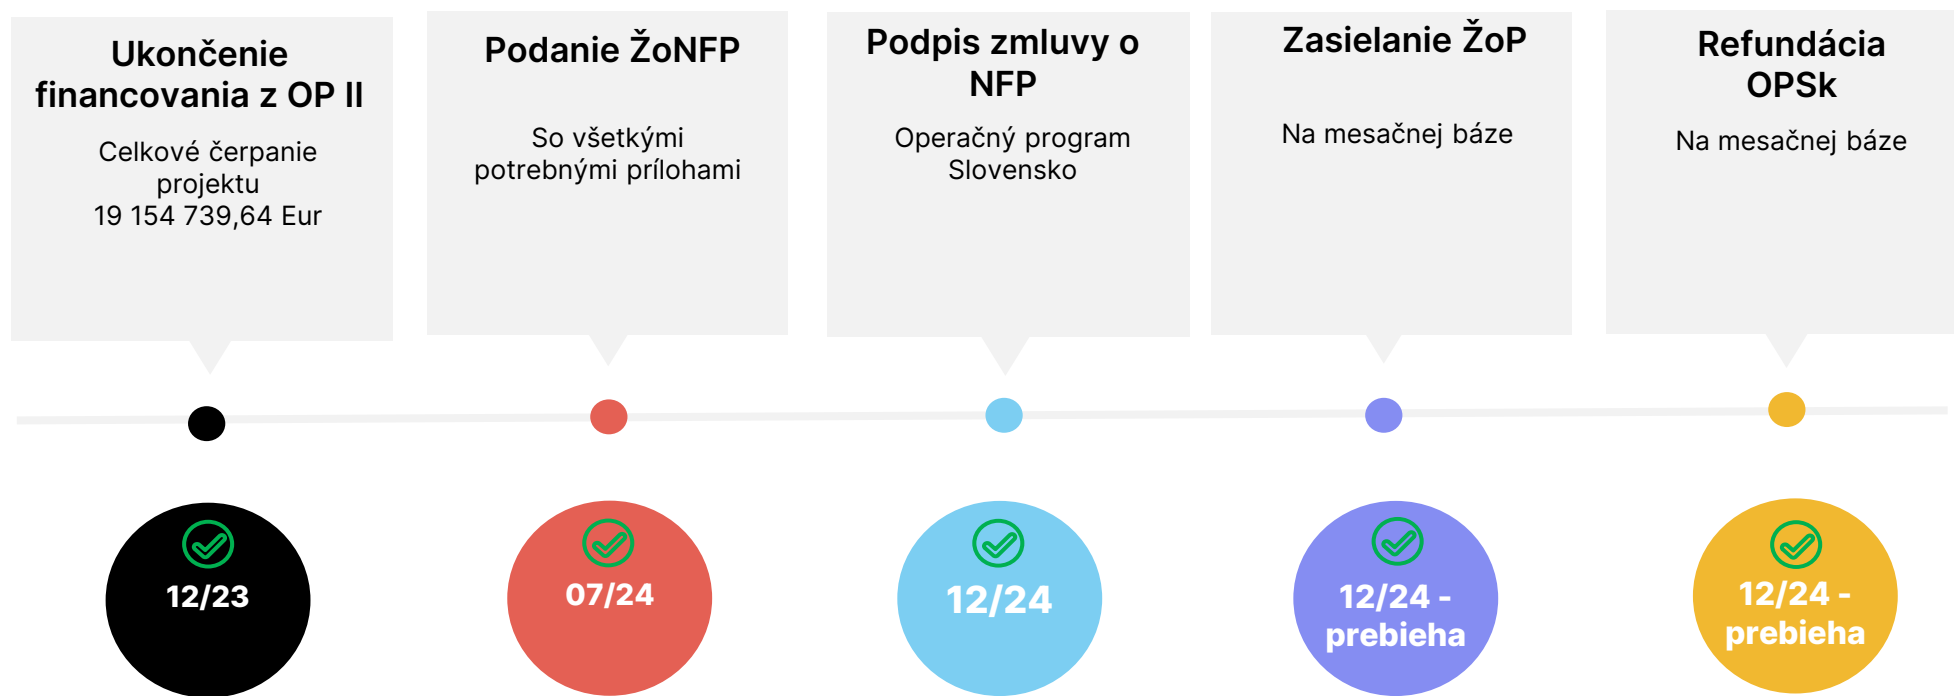

Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

- Ex-post kontrola ostatných dodatkov 17 – 34 k ZoD
- Dňa 01.05.2026 sa uskutočnila Informačná aktivita projektu za účasti zástupcov Európskej komisie, MD SR a MIIRI
- V období 03/2026 bol vykonaný vládny audit
- V období 04-05/2026 bol vykonaný audit NKÚ
- V období 05/2026 bol vykonaný audit Európskej komisie

