

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 18.06.2026

---

**Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica  
- Janíkov dvor**

---

**Predkladateľ:**

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

**Zodpovedný:**

Ing. Samo Rajt

Riaditeľ projektovej kancelárie magistrátu

Projektová kancelária - magistrát

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia

2. Dôvodová správa

3. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v  
Petržalke, 2.časť Bosákova ulica–Janíkov dvor

**Spracovateľ:**

Ing. Marek Bagi

Projektový vedúci

Projektová kancelária - magistrát

## NÁVRH UZNESENIA

---

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor.

## **Dôvodová správa**

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:

- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

#Moderný magistrát


#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo |  
18. jún 2026



# Situácia stavby

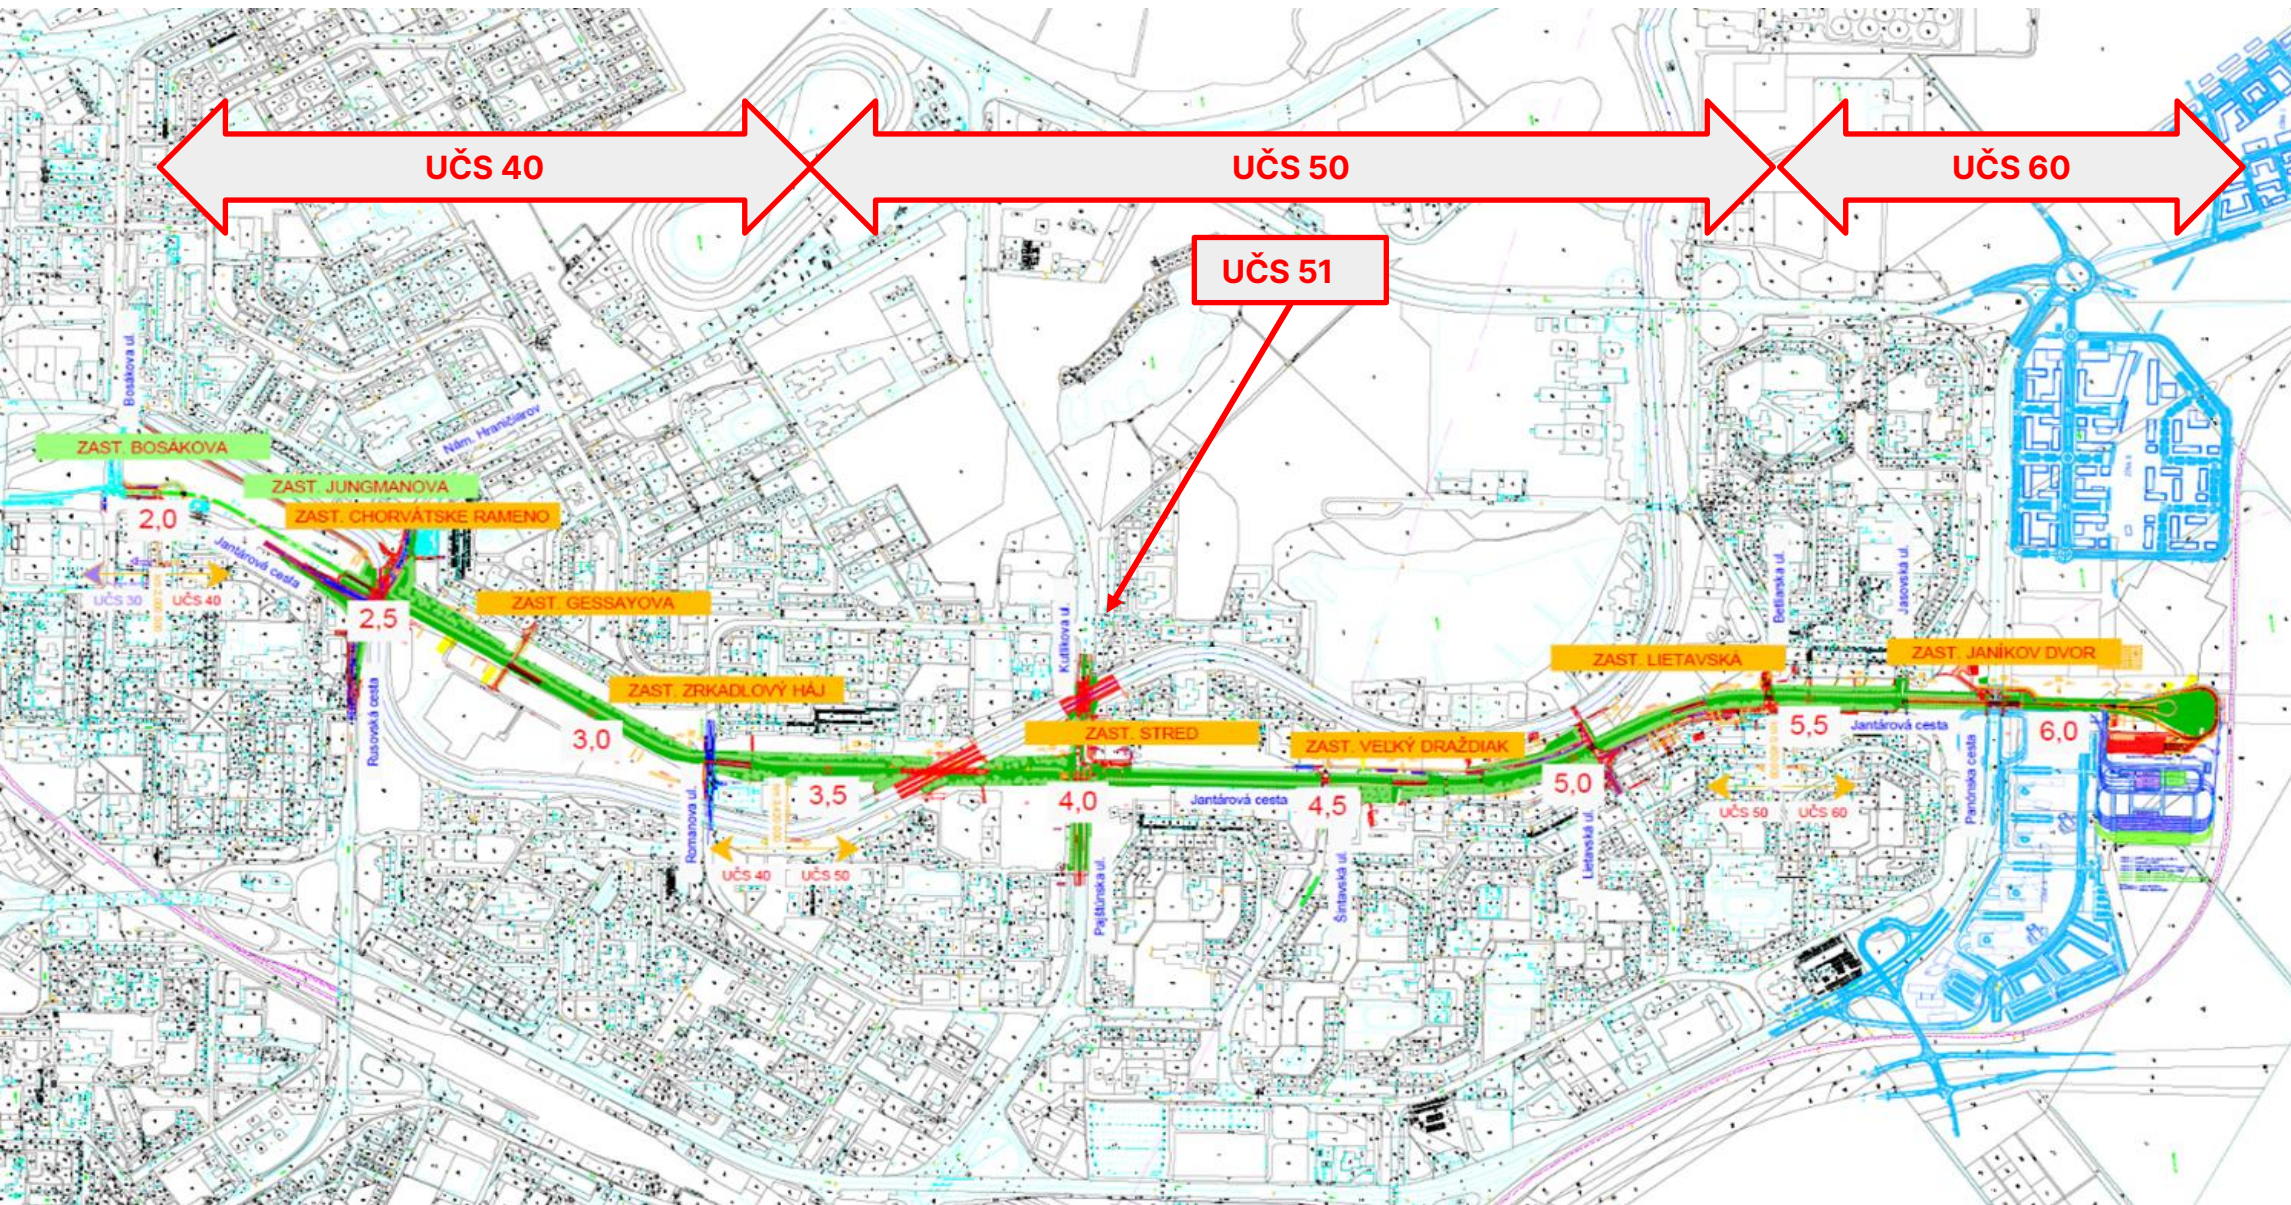

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

### **UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)**

Stavebne ukončené - priebieha odstraňovanie vád (všetky UČS)

### **UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)**

Stavebne ukončené

### **UČS 51 Premostenie Kutlíkova**

Stavebne ukončené

### **UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)**

Stavebne ukončené – prebiehajú skúšky zariadení



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

### - Fotodokumentácia



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia dokončených a prebiehajúcich prác



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia dokončených a prebiehajúcich prác



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

### Stavebne ukončené objekty – protokolárne prevzaté

Hlavné mesto podpísalo preberací protokol o dielo a v zmysle zmluvy o dielo prebieha lehota na oznámenie väd a nedorobkov v lehote 365 dní

Aktuálne prebehajú kolaudačné konania na objekty na UČS 51 a UČS 60 na stavebnom úrade MČ Petržalka a ŠSÚ BSK.

### Fakturácia

Ku koncu 04/2026 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 94 602 397,04 Eur



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

### Dodatky k zmluve o dielo

- Uzatvorené dodatky za predošlé obdobie:
  - Dodatok č. 1 - Dodatok č. 34 k ZoD,
- Uzatvorené dodatky za aktuálne obdobie:
  - Dodatok č. 35 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
  - Dodatok č. 36 k ZoD v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 4Q/2025
  - Dodatok č. 37 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
  - Dodatok č. 38 k ZoD v ktorom sa menili kľúčový odborníci



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch

### Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 - 2025)


Časové obdobie	Valorizačný koeficient (%)	Hodnota (€)
1Q/2022	3,37%	23.803 €
2Q/2022	6,66%	47.277 €
3Q/2022	18,83%	151.309 €
4Q/2022	22,37%	599.399 €
1Q/2023	21,44%	511.546 €
2Q/2023	21,79%	639.198 €
3Q/2023	11,48%	392.163 €
4Q/2023	17,41%	751.876 €
1Q/2024*	18,19%	558.179,74 €
2Q/2024	16,79%	995.069,73 €
3Q/2024	19,38%	1 437.898,12 €
4Q/2024	22,24%	2 462.260,28 €
1Q/2025	31,72 %	2 751 982,37 €
2Q/2025	27,38%	2 263 691,97 €
3Q/2025	27,93%	1 133 523,59 €
4Q/2025	23,46%	691 088,66 €



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Externé financovanie

- Priebeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:

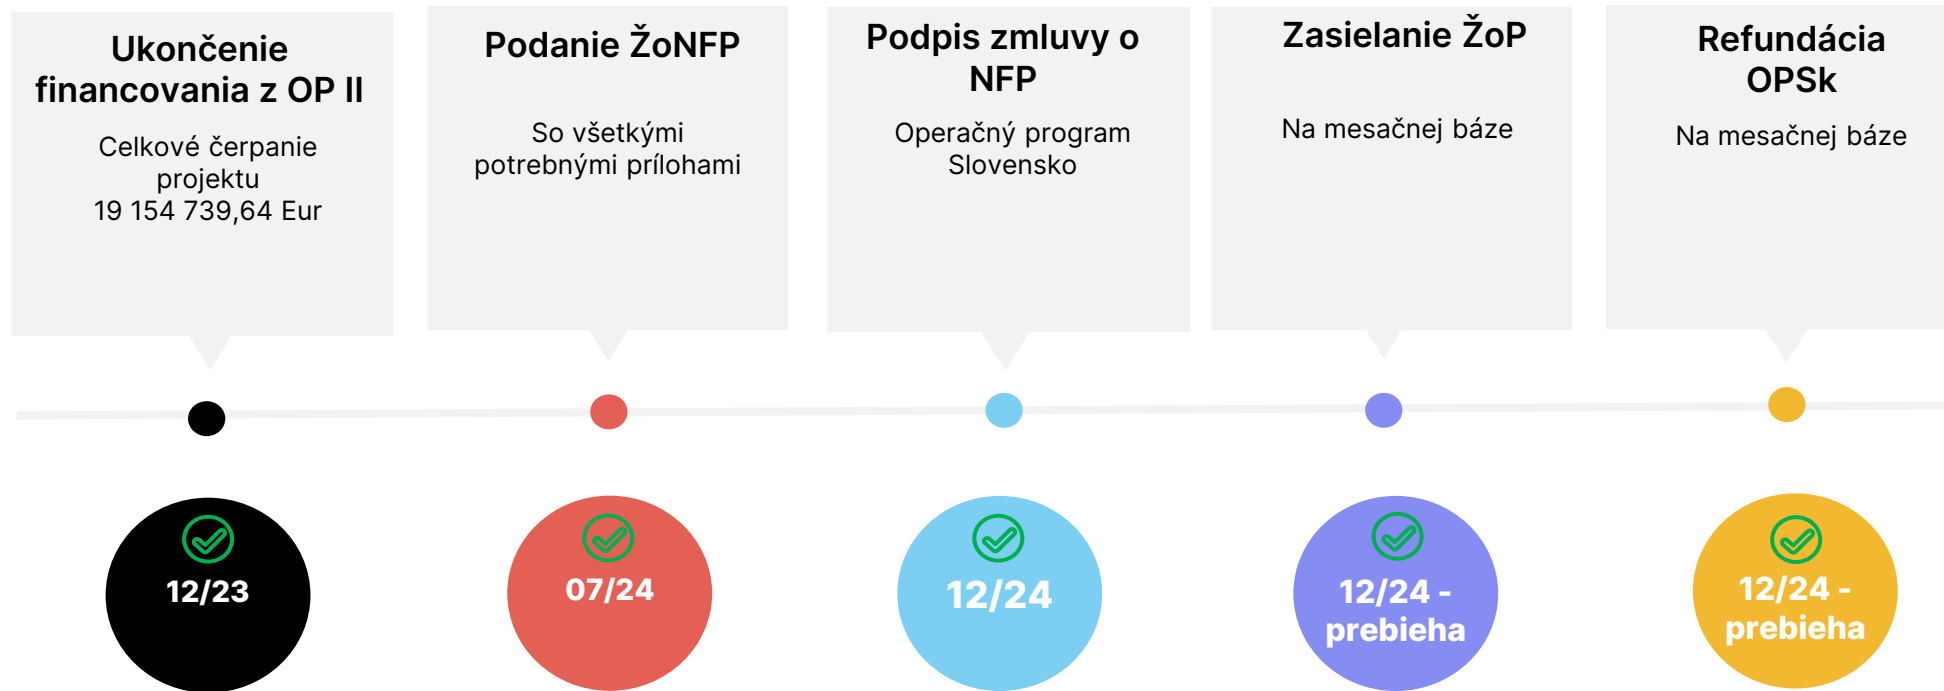

Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

- Ex-post kontrola ostatných dodatkov 17 – 34 k ZoD
- Dňa 05.05.2026 sa uskutočnila Informačná aktivita projektu za účasti zástupcov Európskej komisie, MD SR a MIIRI
- V období 03/2026 bol vykonaný vládny audit
- V období 04-05/2026 bol vykonaný audit NKÚ
- V období 05/2026 bol vykonaný audit Európskej komisie

