

Materiál na rokovanie orgánu:  
Komisia dopravy a informačných systémov  
ktoré sa koná dňa: 16.09.2025

---

**Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor**

---

**Predkladateľ:**

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

**Zodpovedný:**

Ing. Samo Rajt  
Riaditeľ Projektovej kancelárie

**Spracovateľ:**

Ing. Marek Bagi  
Projektový vedúci

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodová správa
2. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor

# NÁVRH UZNESENIA

Komisia dopravy a informačných systémov

## **odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o stave prípravy projektu: "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor".

## **Dôvodová správa**

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne a zároveň na základe Uznesenia č. 856/2017 časť B bod 3 zo dňa 25.5.2017 – Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predkladáme na rokovanie Komisie dopravy a informačných systémov materiál:

**- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.**

#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov


# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo |  
18. september 2025





# Situácia stavby

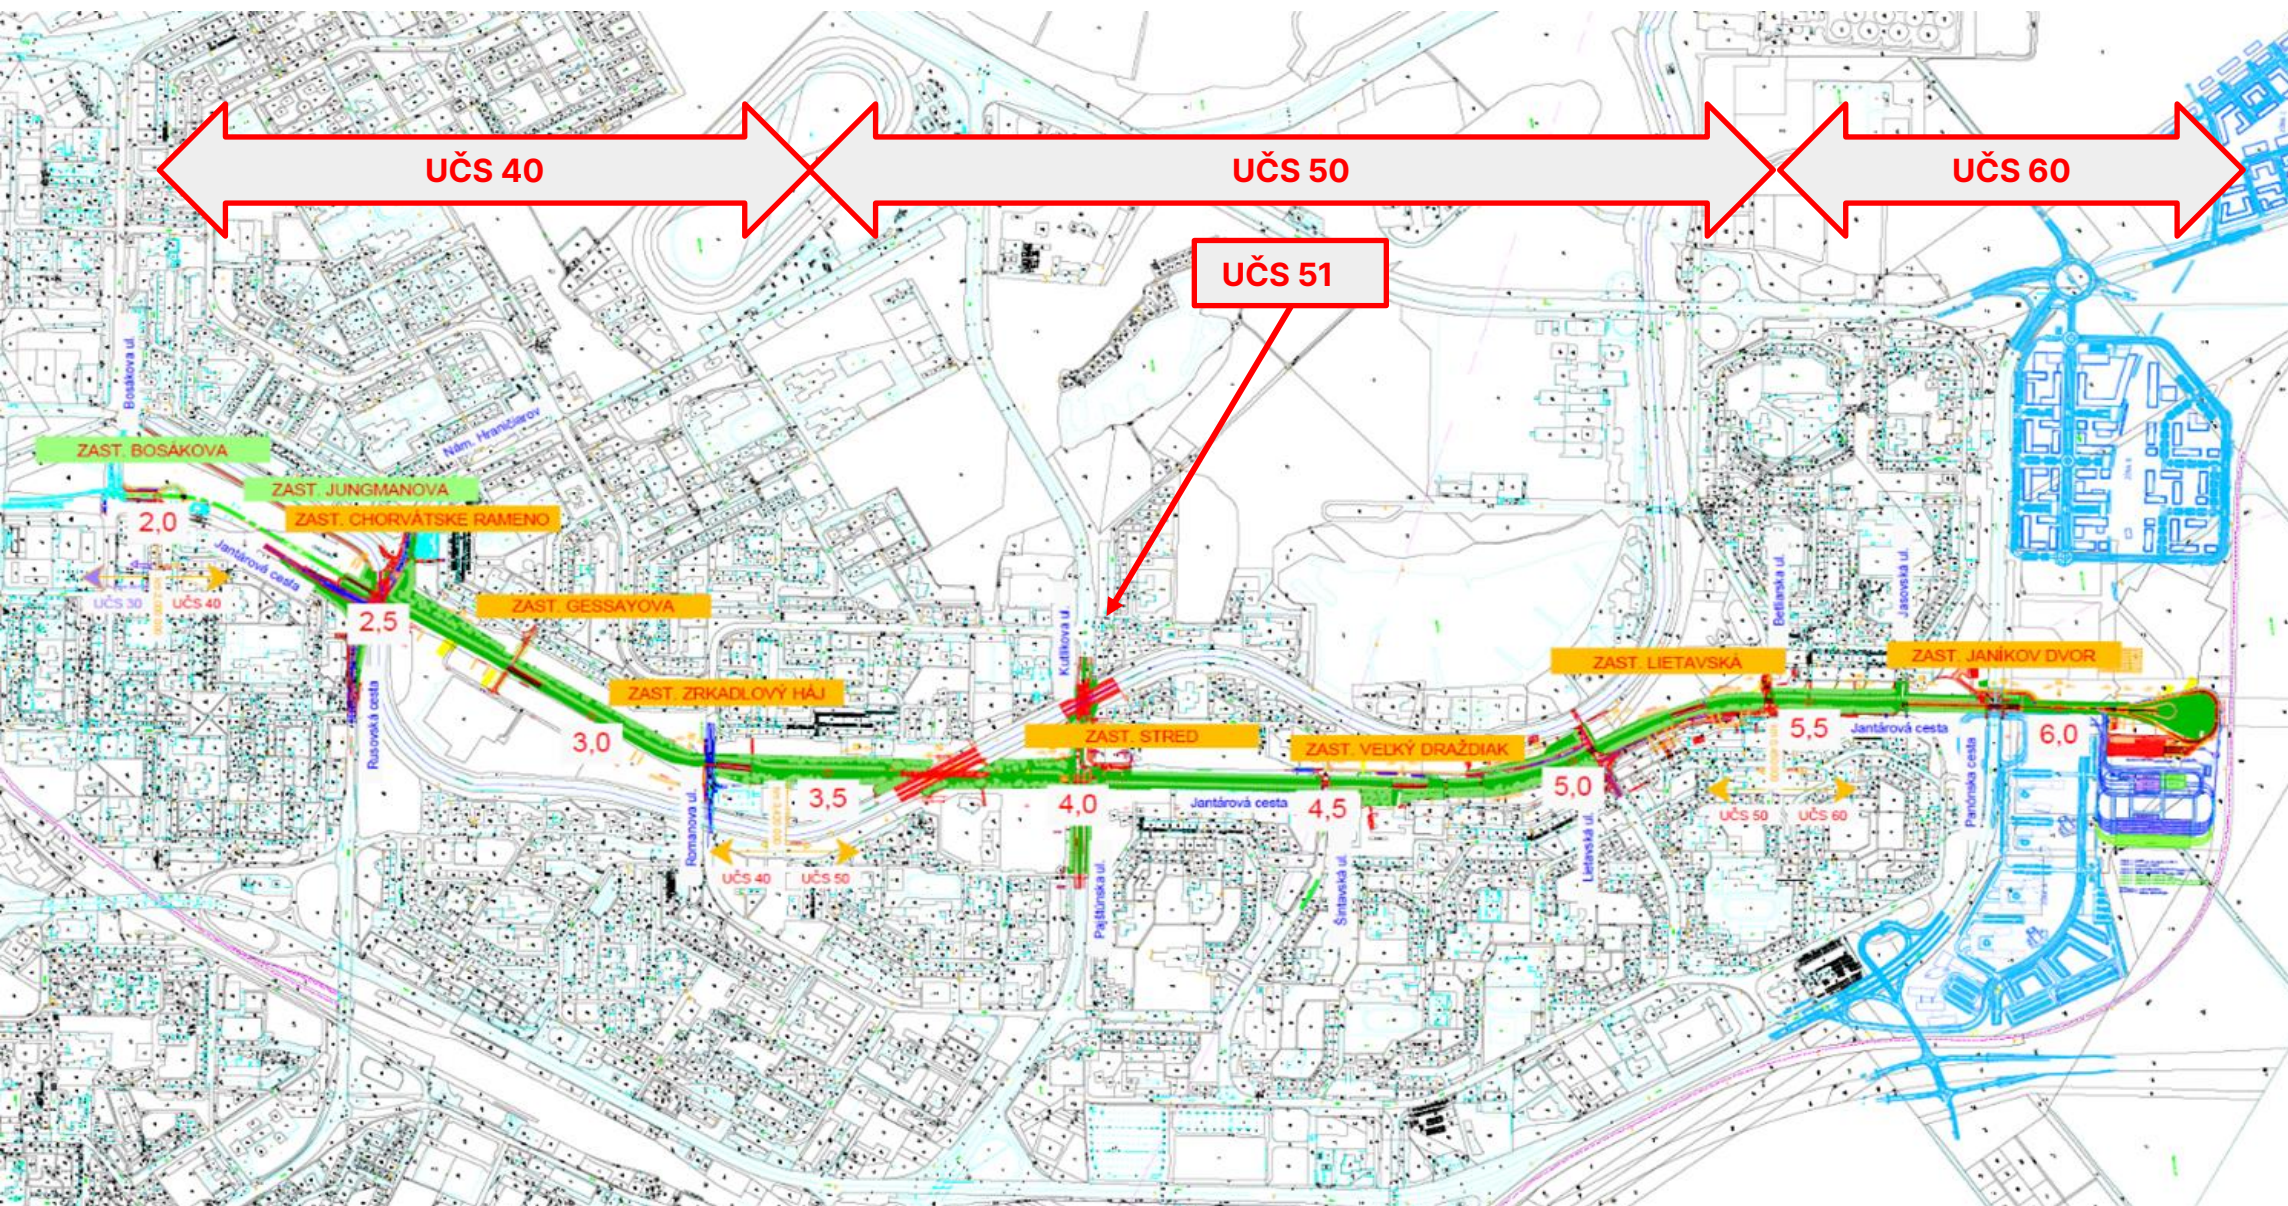



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

Dňa 27.07.2025 bola spustená prevádzka novej trate v úseku Jungmanova – Južné mesto, obsluhované sú všetky nové zastávky: Jungmanova, Gessayova, Zrkadlový háj, Pajštúnska, Veľký Draždiak, Lúčanka a Južné mesto

### **UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)**

ELEKTRICKÝ ZVRŠOK:

- Dokončovanie práce na prístreškoch (všetky UČS)

MOSTY

- Práce ukončené, Hlavná prehliadka mosta

PRELOŽKY IS

- Práce ukončené

CESTNÉ OBJEKTY

- Dokončovanie práce - dorábanie chodníkov, zelených ostrovčekov, dopravné značenie

Náhradná výsadba

- Výsadba stromov, kríkov, rekultivácia, zatrávnenie (všetky UČS)

### **UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)**

MOSTY

- Osádzanie zábradlia, dokončovanie chodníkov v okolí mostu

CESTNÉ OBJEKTY

- dokončovanie práce na vetve Kutlíkova po most 51

### **UČS 51 Premostenie Kutlíkova**

- Zrealizovaná nosná konštrukcia ľavého mostu, debnenie nosnej konštrukcie na pravom moste
- Zrealizované štetovnice na prekládke vodovodu DN800 pod chorvátske rameno – následne trysková injektáž dna, výkop a osádzanie potrubia

### **UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)**

MOSTY

- Lávka smer Jarovce a smer Centrum – osádzanie dilatčných zariadení, následne hydroizolácie a dokončovacie práce
- Zrealizované hydroizolácie a osvetlenie rampy a schodiska, výroba zábradlí, následne ich osádzanie

BUDOVY

- Hala DKO – dobetónovanie prehliadkového kanálu, osádzanie koľajníc na ocelej konštrukcii, prípravné práce na finálnu úpravu podlahy
- Dokončovacie práce v administratívnej časti obklady, dlažby a sanita
- Dokončenie spevnených plôch pri hale



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác





# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác






# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác

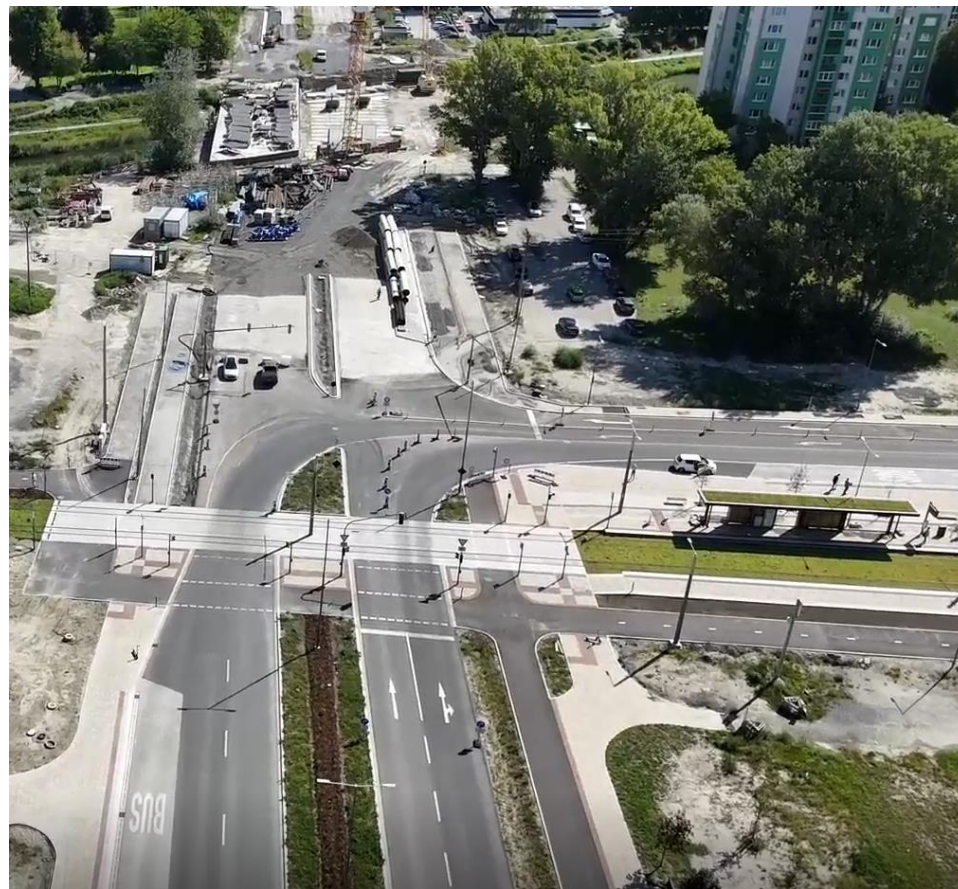




# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác

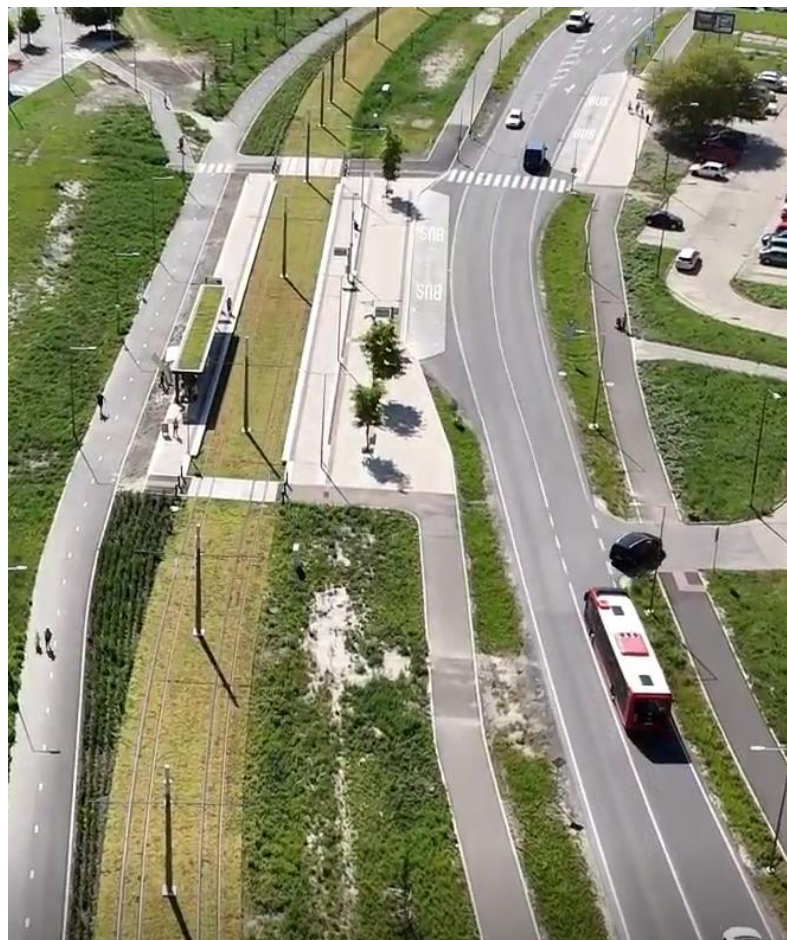



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác





# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

### Stavebne ukončené objekty

#### UČS 40

- 25 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov

#### UČS 50

- 25 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, vedení VN, kanalizácie, vodovodov plynovodov

#### UČS 51

- 13 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov

#### UČS 60

- 18 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení

V priebehu 06/2025 boli vydané kolaudačné rozhodnutia MČ Petržalka a Okresného úradu Bratislava, taktiež rozhodnutia o predčasnom užívaní Špeciálnym stavebným úradom HMSR BA a Bratislavským samosprávnym krajom na stavebné objekty potrebné ku spusteniu trate a taktiež aj licencie na prevádzku a prepravu na novej trati.

### Fakturácia

Ku koncu 07/2025 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 89 837 005,26 (94,7% zo zmluvnej hodnoty diela)



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

### Dodatky k zmluve o dielo

- Uzatvorené dodatky za predošlé obdobie:
  - Dodatok č. 1 - Dodatok č. 26 k ZoD,
- Uzatvorené dodatky za aktuálne obdobie:
  - Dodatok č. 27 k ZoD v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 1Q/2025
  - Dodatok č. 28 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
  - Dodatok č. 29 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
  - Dodatok č. 30 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch

Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 a 2023)		
Časové obdobie	Valorizačný koeficient (%)	Hodnota (€)
1Q/2022	3,37%	23.803 €
2Q/2022	6,66%	47.277 €
3Q/2022	18,83%	151.309 €
4Q/2022	22,37%	599.399 €
1Q/2023	21,44%	511.546 €
2Q/2023	21,79%	639.198 €
3Q/2023	11,48%	392.163 €
4Q/2023	17,41%	751.876 €
1Q/2024*	18,19%	558.179,74 €
2Q/2024	16,79%	995.069,73 €
3Q/2024	19,38%	1 437.898,12 €
4Q/2024	22,24%	2 462.260,28 €
1Q/2025	31,72 %	2 751 982,37 €

Poznámka: \*Odborné vyjadrenie č. 51/2024 k 1Q/2024 bolo upravené z 17,41% na 18,19% pre nesúlad určenia jednotkových cien vybraných položiek






# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Externé financovanie

- Priebeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:

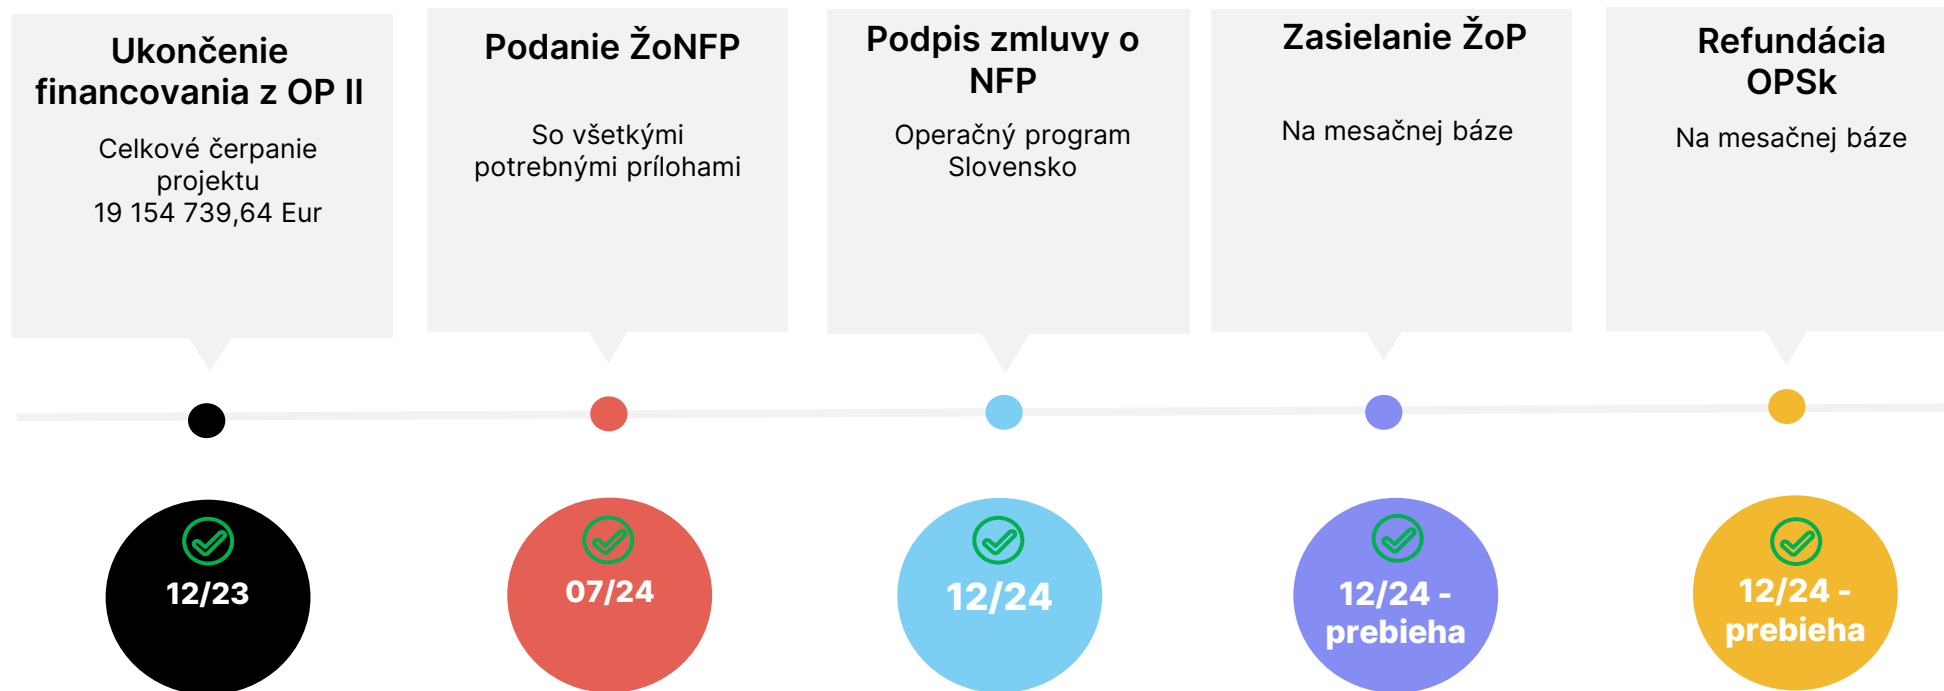

Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

- Ukončený proces posudzovania a schvaľovania IQR pre fázu II.
- Ex-post kontrola ostatných dodatkov 13 – 26 k ZoD
- Počas augusta 2025 prebehol vládny audit na vybranej vzorke žiadostí o platby

